경향관 리모델링 위원회 구성(안)

「예배처 개보수 위원회」를 장기 발전 기구로 확대하는 제안

주관 **경향교회 당회** | 상정 **2026. 10. 25.(주일) 정기당회** | 근거 「예배처 개보수 추진계획서」(2026.09.29 개정) | 작성 2026. 9. 30.(10. 3. 수정)


위원회 명칭 (확정)	1차 사업	장기 과제	조직 규모
경향관 리모델링 위원회	**경향관 개보수**	**연관 기관 개발**	**임원 9 · 업무 4**
1차 사업: 경향관 개보수	1단계: 비전홀 (27.7. 오픈 목표) 2단계: 글로브홀, 교육실 등 경향관 전반	제네바신학대학원대학교 선교관 · 교육관 등 시설 마스터플랜	정·부 임원이 업무 책임 감사는 독립

Ⅰ. 위원회 명칭 확정

구분	내용
위원회 명칭	**경향관 리모델링 위원회**
명칭의 의미	경향관 리모델링을 **추진하는 실행 기구**임을 이름에 담았다. 교인이 이름만 듣고도 위원회가 하는 일을 알 수 있다
1차 사업	경향관 개보수 — 1단계: 비전홀 (27.7. 오픈 목표), 2단계: 글로브홀, 교육실 등 경향관 전반
장기 과제	연관 기관 개발 — 제네바신학대학원대학교 · 선교관 · 교육관 등 시설 마스터플랜
표기 원칙	장기 과제가 이름에 드러나지 않으므로, 대외 문서와 공지에는 「1차 사업: 경향관 개보수」와 「장기 과제: 연관 기관 개발」을 함께 표기한다

■ **운영 방식** — 상위 기구 이름은 「경향관 리모델링 위원회」로 하고, 지금의 과업은 「1차 사업: 경향관 개보수」로 부른다. 기존 계획서(가칭 「예배처 개보수 위원회」)의 임원·업무·일정을 그대로 넘겨받으면서, 비전홀 완공 뒤에도 같은 기구가 연관 기관 개발로 이어 간다.

Ⅱ. 기구 조직도

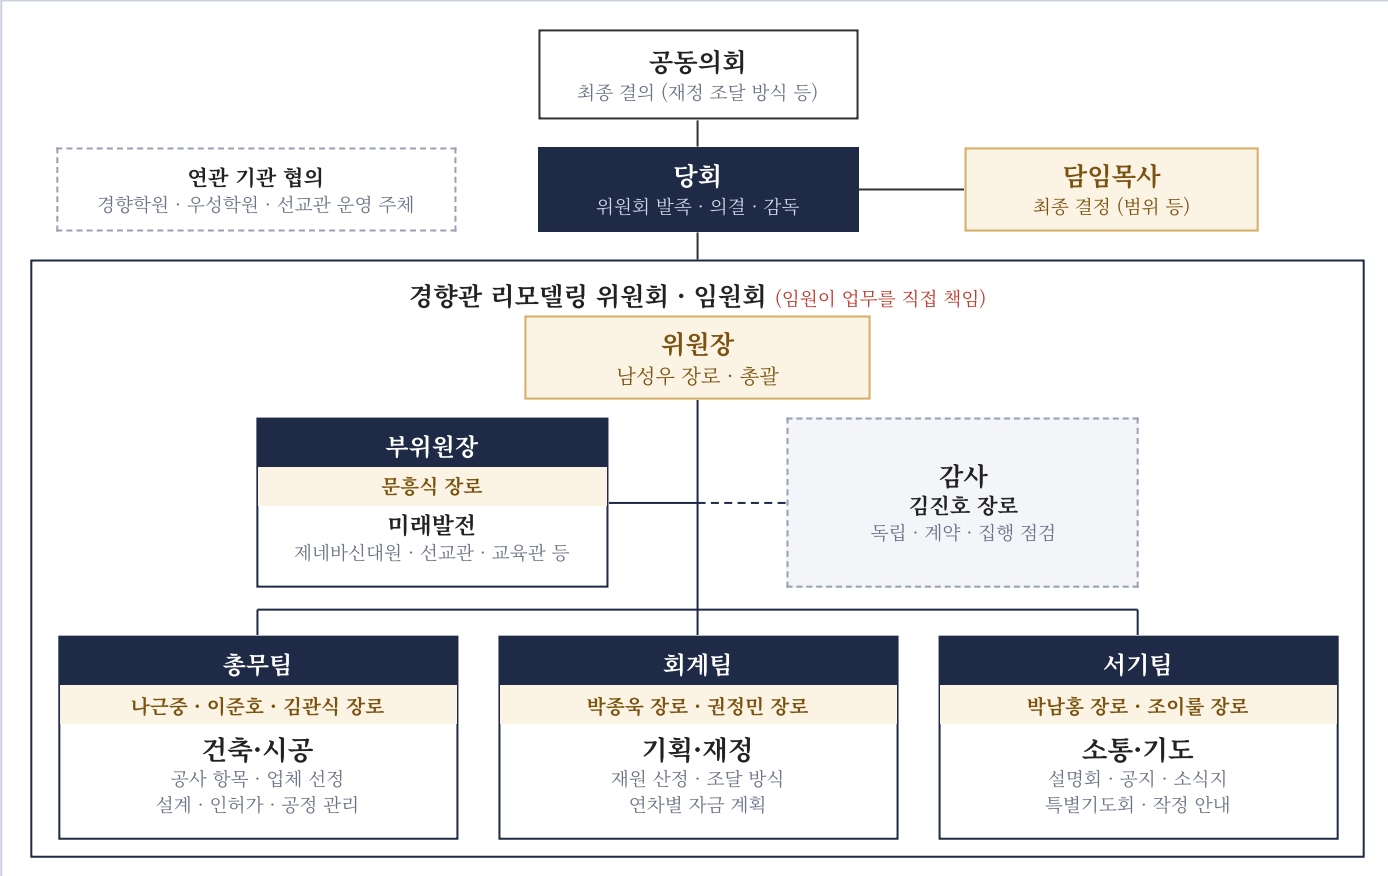

■ 임원 구성과 역할

임원	담당 업무	역할	후보
위원장	— (총괄)	위원회 대표, 당회 보고 책임, 임원회 주재, 지출 공동 결재	**남성우 장로**
부위원장	**미래발전**	위원장 보좌, 제네바신대원 · 선교관 · 교육관 등 연관 기관과의 대외 협의 대표	**문흥식 장로**
총무	**건축·시공**	일정·회의 운영, 업체와의 공식 창구, 공사 실무 총괄 (2027년 3월부터)	**나근중 장로**
부총무 신설	**건축·시공**	총무 보좌, 공사 항목 · 업체 관리 · 설계 · 인허가 · 공정 관리, 연락 · 답사 · 현장 실무 분담	**이준호 장로** **김관식 장로**
서기	**소통·기도**	회의록 · 당회 보고서 · 설명회 자료집 · 소식지를 한 흐름으로 작성	**박남홍 장로**
부서기 신설	**소통·기도**	서기 보좌, 공지 · 소식지 · 설명회 준비 분담, 연락 · 답사 · 현장 실무 분담	**조이룰 장로**
회계 신설	**기획·재정**	재원 계획과 위원회 예산 · 설계비 선집행 관리, 건축헌금 별도 계정 운영	**박종욱 장로**
부회계 신설	**기획·재정**	회계 보좌, 헌금 · 지출 기록 대조, 이중 결재 사전 검토	**권정민 장로**
감사 신설	없음 (독립)	계약 · 집행 점검, 공동의회에 감사 결과 보고. 임원회에 참석하되 의결에는 참여하지 않음	**김진호 장로**

■ 임원 업무 운영 원칙

- **회계(기획·재정)** — 계획과 집행이 한 사람에게 모이므로, 실제 출납(통장 · 지출)은 교회 재정부를 거치고 지출은 위원장 · 회계 이중 결재로 한다.
- **총무(건축·시공)** — 업체 선정은 총무 단독이 아니라 임원회 의결로 정하고, PT 평가표를 기록으로 남긴다. 11~12월 일정 포화는 부총무가 실무를 나눠 맡는다.
- **서기(소통·기도)** — 회의록에서 설명회 자료집 · 소식지까지 한 사람이 맡아 교인에게 가는 메시지를 일관되게 한다.
- **감사** — 업무를 맡지 않고 의결에서 떨어져 있어야 공동의회 감사 보고의 신뢰가 선다. 미래발전은 대외 협의 성격에 맞춰 부위원장이 맡는다.

Ⅲ. 업무 구성 — 4개 업무

업무	주요 업무	계획서 연계	구성(안)
미래발전 신규	제네바신학대학원대학교 · 선교관 · 교육관 등 연관 기관의 시설 현황 조사와 장기 마스터플랜 수립, 부지 · 소유 관계와 법적 절차 검토, 기관과 정례 협의	계획서 밖 (장기 과제)	부위원장 + 기관별 협의 대표
기획·재정	총 소요 재원 산정, 조달 방식(대출 / 작정헌금 / 병행) 검토, 3~5개년 연차별 자금 계획, 공동의회(2027.1.17.) 상정안 작성	업무 1 · 4	회계 · 부회계 + 재정·금융 경험 교인 2~3명
건축·시공	5개 공간별 공사 항목·수준 확정, 교회 건축 특화 업체 3곳 견적·PT, 설계·인허가·공정 관리, 조별 답사 주관, 건설사업관리(CM) 도입 검토	업무 2 · 3 · 5	총무 · 부총무 + 건축·설비·인테리어 전문 교인 3~4명
소통·기도	전교인 설명회(12.27.) 자료집, 주보·홈페이지 정기 공지와 소식지, 특별기도회(11.2.~14.) 기도 제목, 작정 안내	업무 6	서기 · 부서기 + 교역자 1명 + 남·여전도회 · 청년 대표

■ 업무를 4개로 정한 이유

- 계획서의 6개 업무(재원·업체·공사 항목·분할 계획·답사·교인 소통)가 성격상 3개 업무로 자연스럽게 묶이고, 여기에 장기 과제 1개만 더했다.
- 업무를 더 나누면 8개 조 답사·워크샵을 함께 맡는 당회원들이 여러 역할을 겸하게 되어 실무가 느려진다. 정·부 임원 체제로 한 사람에게 쏠리는 부담도 나눈다.
- 답사는 전 당회원이 참여하므로 별도 업무로 두지 않고 건축·시공(총무)이 주관한다.

Ⅳ. 단계별 운영

단계	기간	중점	가동 업무
1기 · 1차 사업	2026.10. ~ 2027.8.	공동의회 결의와 비전홀 완공(존 페스코 학술대회)에 집중	기획·재정 · 건축·시공 · 소통·기도 중심, 미래발전은 현황 조사만
2기 · 확장	2027.9. ~ 2031.	개보수 2·3단계 시행, 연관 기관 마스터플랜 수립·보고	4개 업무 모두 가동 (미래발전 본격화)
3기 · 기관 개발	2031. 이후	마스터플랜에 따른 기관별 개발 착수	사업별 건축위원회를 따로 두고, 위원회는 총괄 조정

■ **유의 사항** — 학교 시설은 별도 학교법인(경향학원 · 우성학원)의 재산이므로, 학교 시설 개발은 해당 법인 이사회 의결과 관련 법령 절차를 따라야 한다. 위원회는 교회 쪽 계획 수립과 협력 창구 역할로 범위를 정해 두는 것이 안전하다.

Ⅴ. 타 교회 사례와 시사점

사례	내용	우리 조직에 반영
새문안교회 신교육관 건축위원회	위원장·위원·서기 외에 안수집사·집사를 '전문위원'으로 따로 선임. 설계설명회에서 성도 질의응답을 받고, 반영 가능한 의견은 설계자와 협의해 반영	소통·기도 설명회와 의견 반영 절차
새문안교회 새 예배당	2007년 당회 건축 결의 → 2010년 설계자 선정 → 2014년 착공. 결의부터 착공까지 7년. 'e새성전건축' 소식지로 진행을 공유	1~3기 단계 운영, 정기 소식지
기독교대한감리회 장단기발전위원회	장기 발전안을 권역별 공청회를 거쳐 제안서로 발간	미래발전 결과물을 공청회 · 보고서로 정리
건사모(건축을 사역으로)	설계에 드러나지 않은 공사와 공사 중 설계 변경이 예산 초과의 주원인. 건설사업관리(CM)로 예산을 투명하게 관리할 것을 권장	건축·시공 CM 검토, 설계 확정 뒤 변경 최소화
연합감리교회 건축 안내	건축위원회 외에 설계사 · 건설사업관리자 · 계약 경험 있는 변호사 등 전문가 팀을 두고, 공식 입찰로 시공사 선정	업체 3곳 비교 PT, 계약 검토에 법률 자문
서울 OO교회 단계별 리모델링	재정 여력에 맞춰 공사를 단계별로 나누고, 빚 없이 진행하는 것을 원칙으로 함	3~5개년 분할, 기획·재정 연차 계획

공개 자료에서 하위 조직 이름과 역할까지 밝힌 교회 사례는 많지 않았다. 위 조직안은 사례에서 확인된 원칙(성도 소통 · CM · 단계별 재정)을 계획서의 업무 범위에 맞춰 조합한 제안이다.

Ⅵ. 10.25.(주일) 정기당회 상정 사항

No	상정 사항
1	위원회 명칭 확정 — 「경향관 리모델링 위원회」(1차 사업: 경향관 개보수)
2	임원 선임 — 위원장 남성우 장로, 부위원장 문흥식 장로(미래발전), 총무 나근중(2027. 3.부터) · 부총무 이준호 · 김관식 장로(건축·시공), 서기 박남홍 · 부서기 조이룰 장로(소통·기도), 회계 박종욱 · 부회계 권정민 장로(기획·재정), 감사 김진호 장로(독립)
3	업무 운영 원칙(이중 결재 · 업체 선정 임원회 의결) 승인, 업무별 실무위원은 11월 첫 주까지 위촉
4	제네바신대원 · 선교관 · 교육관 협의 창구 지정

출처 · 새문안교회 소식지 2003-08 (신교육관 건축위원회) · 새문안교회 교회건물변천사 · 새문안교회 e새성전건축 · 기독교대한감리회 장단기발전위원회 공청회 자료 · 기독일보 「20년 이상 교회 건축 노하우로 건축 부도 막는다」 · UMC Discipleship Ministries 「도시 목회와 교회 건축」 · 교회건축 컨설팅 사례 (서울 OO교회)

Ⅶ. 추진 방향 검토 당회 요청 반영

■ **요청 요지**

- **방향성** — 「어디 · 언제 · 재원은 어떻게」 세 가지를 예로 들어 **5개년 실행안**을 검토한다
- **장기수선충당금**을 **2027년부터** 적립하고, **교회 내 에너지 절약 매뉴얼**을 작성한다
- 예배처 홀 3개 중 **1개를 세미나 · 컨퍼런스 · 예식장** 등 다목적 용도로 확보한다
- **소그룹 모임실**은 **지상 2층 중앙 방향 빈 공간**과 **지하 3층 (구)서고**를 활용하는 방법을 찾는다
- 그럼에도 **비전홀**은 **2027. 8. 존 페스코 목사님 초청 행사**가 있으므로 **빠른 시일 내 착공**한다

1. 비전홀 — 행사일에서 거꾸로 짠 착공 일정 2027. 8. 행사 기준 역산

시기	할 일	담당	비고
2026. 10. 25.	정기당회 — 위원회 구성과 함께 **비전홀 우선 착공 원칙** 의결	당회	설계 · 견적 즉시 착수 근거
2026. 11.	교회 건축 특화 업체 3곳 견적 · PT, 설계 착수 (설계비 선집행)	총무팀 · 회계팀	총무 부임(2027. 3.) 전까지 부총무가 실무
2026. 12.	설계 확정 · 인허가 사전 검토, 12. 27. 전교인 설명회	총무팀 · 서기팀	다목적 용도 반영 여부도 이때 확정
2027. 1. 17.	**공동의회 결의 → 즉시 계약**	당회 · 회계팀	재원 조달 방식 함께 결의
2027. 2. ~ 6.	착공 · 시공 (약 4~5개월)	총무팀	주간 공정 점검, 설계 변경 최소화
2027. 7.	준공 · 시운전 · 음향 / 영상 리허설	총무팀	지연 시 행사 사용 범위를 7월 초 확정
2027. 8.	**존 페스코 목사님 초청 행사**	위원회 전체	

■ **일정에 여유가 없다**

공사 기간을 4~5개월로 보면 늦어도 **2027년 2~3월에는 착공**해야 한다. 공동의회(1. 17.) 전까지 설계 · 견적 · 업체 비교를 끝내 두어야 결의 직후 계약할 수 있다. 비전홀은 5개년 계획의 다른 공사와 떼어 **1년차 우선 공사**로 먼저 진행한다.

2. 5개년 실행안 — 어디 · 언제 · 재원 (예시) 2027 ~ 2031 · 순서와 재원은 검토용 예시

연차	언제	어디 (공간)	무엇	재원 (예)
1년차	2027 상반기	**비전홀**	전면 개보수 — 8월 초청 행사 대응	교회 적립금 + 1차 작정헌금 (필요 시 단기 차입)
1년차	2027 하반기	**다목적홀** (예배처 홀 3개 중 1곳)	세미나 · 컨퍼런스 · 예식 겸용 — 가변 좌석 · 무대, 음향 · 영상, 준비실	1차 작정헌금
2년차	2028	**지상 2층 중앙 빈 공간**	소그룹실 조성 — 가변 칸막이로 소 · 중형 룸 구성	2차 작정헌금
3년차	2029	**지하 3층 (구)서고**	모임실 · 소그룹실 전환 — 환기 · 제습 · 소방 보강 선행	2차 작정헌금
4년차	2030	나머지 예배처 홀	개보수 (분할 공사)	3차 작정헌금
5년차	2031	공용부 · 설비 전반	냉난방 · 전기 · 조명(LED) 교체, 에너지 설비 — 연관 기관 마스터플랜 보고	장기수선충당금 + 에너지 절감분

3. 재원 조달 — 세 가지 예 기획 · 재정(회계팀)이 비교해 공동의회 상정안에 담는다

안	방식	장점	유의점
A · 작정헌금 중심	5개년 연차별 작정헌금으로만 진행 (무차입)	빚 없이 진행	공사 속도가 헌금 속도에 묶임 — **비전홀 일정 위험**
B · 대출 선집행	대출로 주요 공사를 먼저 하고 작정헌금으로 상환	비전홀 · 다목적홀 조기 완공	이자 부담, 상환 계획을 공동의회에서 결의
C · 병행	1년차 비전홀만 적립금 · 단기 차입으로 먼저 하고, 2년차부터 작정헌금 범위 안에서 진행	행사 일정과 재정 안정의 균형	차입 한도 · 상환 기한을 미리 정해 둔다

4. 다목적홀 — 예배처 홀 3개 중 1곳 세미나 · 컨퍼런스 · 예식장

구분	내용
필요 사양	가변(이동식) 좌석 · 무대, 음향 · 조명 · 영상(통역 부스 검토), 준비실 · 신부대기실, 다과 · 케이터링 동선
선정 기준	접근성(출입구 · 엘리베이터), 수용 인원, 주일 예배에 주는 영향, 주차 · 동선
운영	대관 규정 · 사용료 기준을 따로 만들고 예약 창구를 한곳으로 정한다
비전홀과의 관계	존 페스코 목사님 초청 행사도 컨퍼런스 성격이다. **비전홀을 다목적 사양으로 설계하는 안**을 함께 비교하고, **비전홀 설계 확정(2026. 12.) 전에 결정**해야 재공사를 피할 수 있다

5. 소그룹 모임실 — 두 공간 활용

공간	활용안	먼저 확인할 것
지상 2층 중앙 빈 공간	가변 칸막이로 4~6인 · 10~12인 룸 구성, 예약제 운영	피난 동선 · 방화구획, 바닥 하중, 냉난방 · 조명 연결
지하 3층 (구)서고	서고 정리 뒤 모임실 · 소그룹실 · 기도실로 전환	환기 · 제습(결로 · 곰팡이), 비상조명 · 피난 경로, 소방 설비, 용도 변경 인허가 필요 여부

6. 장기수선충당금 — 2027년부터 적립

구분	내용
시작	2027년 예산부터 매년 적립
기준 (예)	경상 예산의 일정 비율, 또는 장기수선계획 금액의 연평균
관리	건축헌금과 분리한 별도 계정 — 회계팀 관리, 출납은 재정부
사용	장기수선계획에 정한 대수선(지붕 · 방수 · 설비 교체 등)에만, 당회 의결
선행	2027 상반기 설비별 교체 주기 · 예상 비용을 담은 장기수선계획 작성

7. 교회 내 에너지 절약 매뉴얼

항목	내용 (초안)
냉난방	적정 설정온도 기준, 예배 · 모임 30분 전 가동, 종료 즉시 정지
공간 배정	평일 모임을 같은 층 · 구역으로 모아 배정, 예약과 냉난방 연동
조명 · 전기	LED 교체 계획, 빈 공간 소등, 대기전력 차단, 퇴실 점검표
점검	필터 청소 · 설비 점검 주기, 월별 전기 · 가스 사용량 기록 · 비교
일정	총무팀 + 관리부 작성(2027 상반기), 하반기 시행, 서기팀이 교인 안내

8. VI에 이어 추가 상정 사항 (안)

No	상정 사항
5	**비전홀 우선 착공** — 2027. 8. 존 페스코 목사님 초청 행사에 맞춰 설계 · 업체 선정 즉시 착수 (설계비 선집행)
6	5개년 실행안(어디 · 언제 · 재원) 검토 착수 — 재원 3안 비교 결과를 공동의회(2027. 1. 17.) 상정안에 반영
7	다목적홀(예배처 홀 3개 중 1곳) 선정과 소그룹실(지상 2층 중앙 빈 공간 · 지하 3층 (구)서고) 활용 방안 검토
8	장기수선충당금 2027년부터 적립, 교회 내 에너지 절약 매뉴얼 작성
